




De voorbereidingen voor het project Oranjelaan fase 2 hebben niet stilgelegen. De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de aannemer is geselecteerd! Ook Stedin is gestart met haar werkzaamheden.

Aannemer

Gebr. Van Kessel uit Dordrecht is geselecteerd als aannemer voor het project. Deze aannemer is al bekend in de omgeving. Hij heeft namelijk ook de werkzaamheden in de Merwedestraat en Oranjelaan fase 1 uitgevoerd en hetzelfde projectteam pakt dit project ook op.

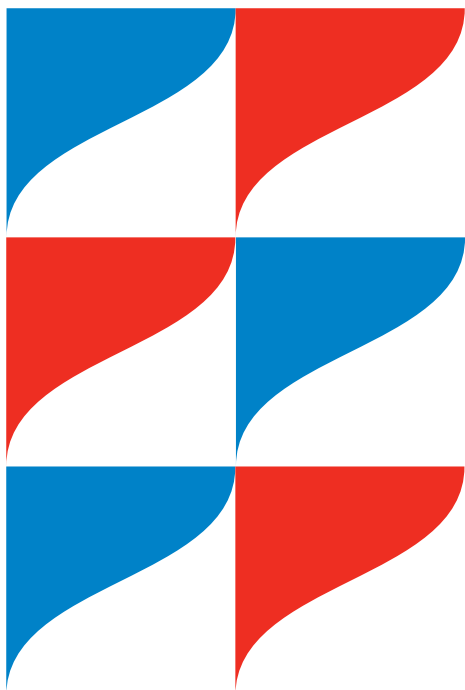

Middenberm

In januari zijn de bomen in de middenberm van de Oranjelaan gekapt. De kap van de bomen was nodig om kabels en leidingen te vervangen en de middenberm te versmallen. Daarnaast was een aantal bomen niet levensvatbaar meer. Aan het eind van de reconstructie worden er 52 nieuwe bomen geplant. Ook is de middenberm opgeschoond, zodat de aannemer van Stedin geen hinder heeft van obstakels.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen van Stedin

Afgelopen periode heeft Stedin haar werkzaamheden voorbereid. Tijdens deze voorbereidingen is Stedin voor een aantal uitdagingen komen te staan. Hierdoor is later gestart met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Daarnaast duren die werkzaamheden ook langer dan beoogd.

Aannemer Van Gelder voert in opdracht van Stedin de werkzaamheden op de Oranjelaan uit. Deze duren ongeveer vier maanden.

Planning

Door de latere start van Stedin start ook Gebr. Van Kessel later met hún werkzaamheden aan de Oranjelaan. Het werk aan de Oranjelaan moet afgerond zijn vóór 1 november 2018. Na deze datum moet de stad optimaal bereikbaar zijn voor de Dordtse Synode. Om deze datum te kunnen halen, voert Gebr. Van Kessel zijn werkzaamheden in een kortere periode uit. De nieuwe bomen worden in december geplant, als al het blad van de bomen is.



Overlast en volgorde

Omdat van Kessel nog niet in de Oranjelaan kan starten (vanwege het werk van Stedin) wordt eerst gestart met de kruising Sumatraplein. Tegelijk wordt het Oranjepark aangepakt. Het Oranjepark zou eerder pas na 1 november 2018 uitgevoerd worden. Het werk aan deze straten gebeurt in april, mei en juni. Omdat alle werkzaamheden in een kortere periode moeten worden uitgevoerd, is de overlast wat groter. Door toch voldoende parkeerplaatsen beschikbaar te houden tijdens de uitvoering, blijft de overlast wat dat betreft beperkt. Wel moet nu in enkele weekenden 's avonds of 's nachts gewerkt worden om toch op tijd klaar te zijn.



Op de hoogte blijven

In april organiseren wij een bewonersavond waar wij de werkwijze en planning toelichten. Tot die tijd kunt u de voorbereidingen en de voortgang van het project volgen via de app '**Oranjelaan fase 2**'. De app is gratis te downloaden via de Appstore en Playstore. Ook kunt u de Facebookpagina '**Oranjelaan fase 2**' van het project volgen.

Ook informatie over de werkzaamheden van Van Gelder vindt u in de app en op de Facebookpagina. Denk hierbij aan hinder, omleidingen, de planning op hoofdlijnen en de voortgang van de werkzaamheden.

Heeft u vragen?


Via de volgende kanalen en/of personen kunt u uw vraag stellen:

Voor de werkzaamheden van Van Gelder:

- Harry de Groot via (06) 20 47 85 11
hdegroot@vangelder.com

Heeft u vragen over het project 'Reconstructie van de Oranjelaan' en de werkzaamheden van Gebr. Van Kessel:

- App 'Oranjelaan fase 2' via vragenformulier
- Via e-mail oranjelaanfase2@gmail.com
- Omgevingsmanager Alexandra Braas, via telefoonnummer (06) 14 88 51 51
- www.dordrecht.nl/oranjelaan

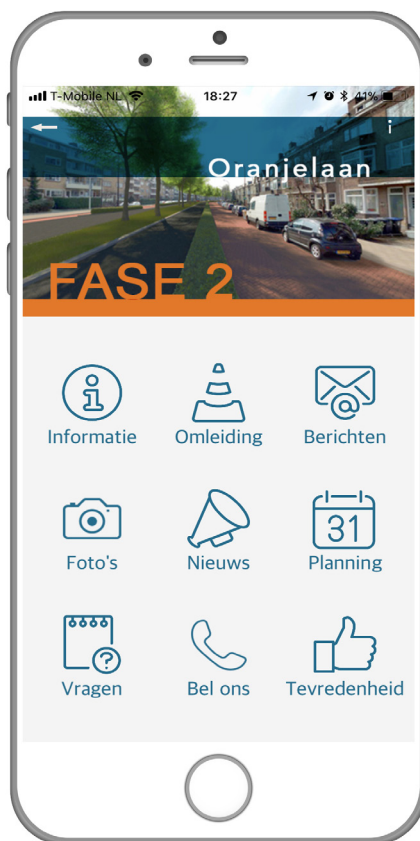

Alle informatie, tekeningen en documentatie is in te zien op www.dordrecht.nl/oranjelaan.

Bovendien staat hier een 3-D animatie van het toekomstige straatbeeld van de Oranjelaan.

De animatie start bij de afrit van de N3/Merwedestraat. Het gaat om de noordoostelijke stadsentree.

Projectmanager is Peter de vet.

E: pajm.de.vet@dordrecht.nl.

T: (06) 13 14 64 75.

Colofon:

Oplage: 3000

Redactie/Eindredactie:

Ingenieursbureau Drechtsteden en
Communicatie Dordrecht.

Verspreiding: Groot Verzet

Fietskoeriers
